



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P03064128



N 156346

Resi code:

Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

Oost & West-Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

Brabant

tel.: 02 674 57 11

Wallonië

tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: Elst R

Adres: Oude Baan 30B38 6LV

Ident. Kaart nr.:

Post nr. + Stad: 2160 Namur

BTW nr.: BE 0435: 621.159

Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276: verzwarende	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid			☐ Art ...	☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	<u>59144880009075835</u>	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:			
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A):	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr.:	
	Ontworpen voor U _N :	☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A):	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 40 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☒ aardingslus ☐ pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord:	<u>2</u> X <u>10</u> mm ² - Type: <u>KUB</u>		
	Algemene differentieelstroominrichting:	<u>30</u> A <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>1</u>	Aantal eindstroombanen: <u>10</u>
zie bijlage(n)				

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Teestellen	☐ Materieel	☐ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand:	<u>7,2</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau:	<u>>50</u> MΩ	☐ Controle-leiding	☐ Aardingscontinuïteit	☐ Test-diff.
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB of aangestelde:
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		
☐ Nihil		
Opmerkingen		
☒ Nihil		

Besluit(en):

- ☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: Verbeek Kevin

Agent nr.: 3076 Datum: 24/08/2020


Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): 1

☒ Eéndraadsschema(s): 1

Voor de directeur generaal: Handtekening

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor
29-08-2035 (*)
☐ door hetzelfde erkend organisme

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we U ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

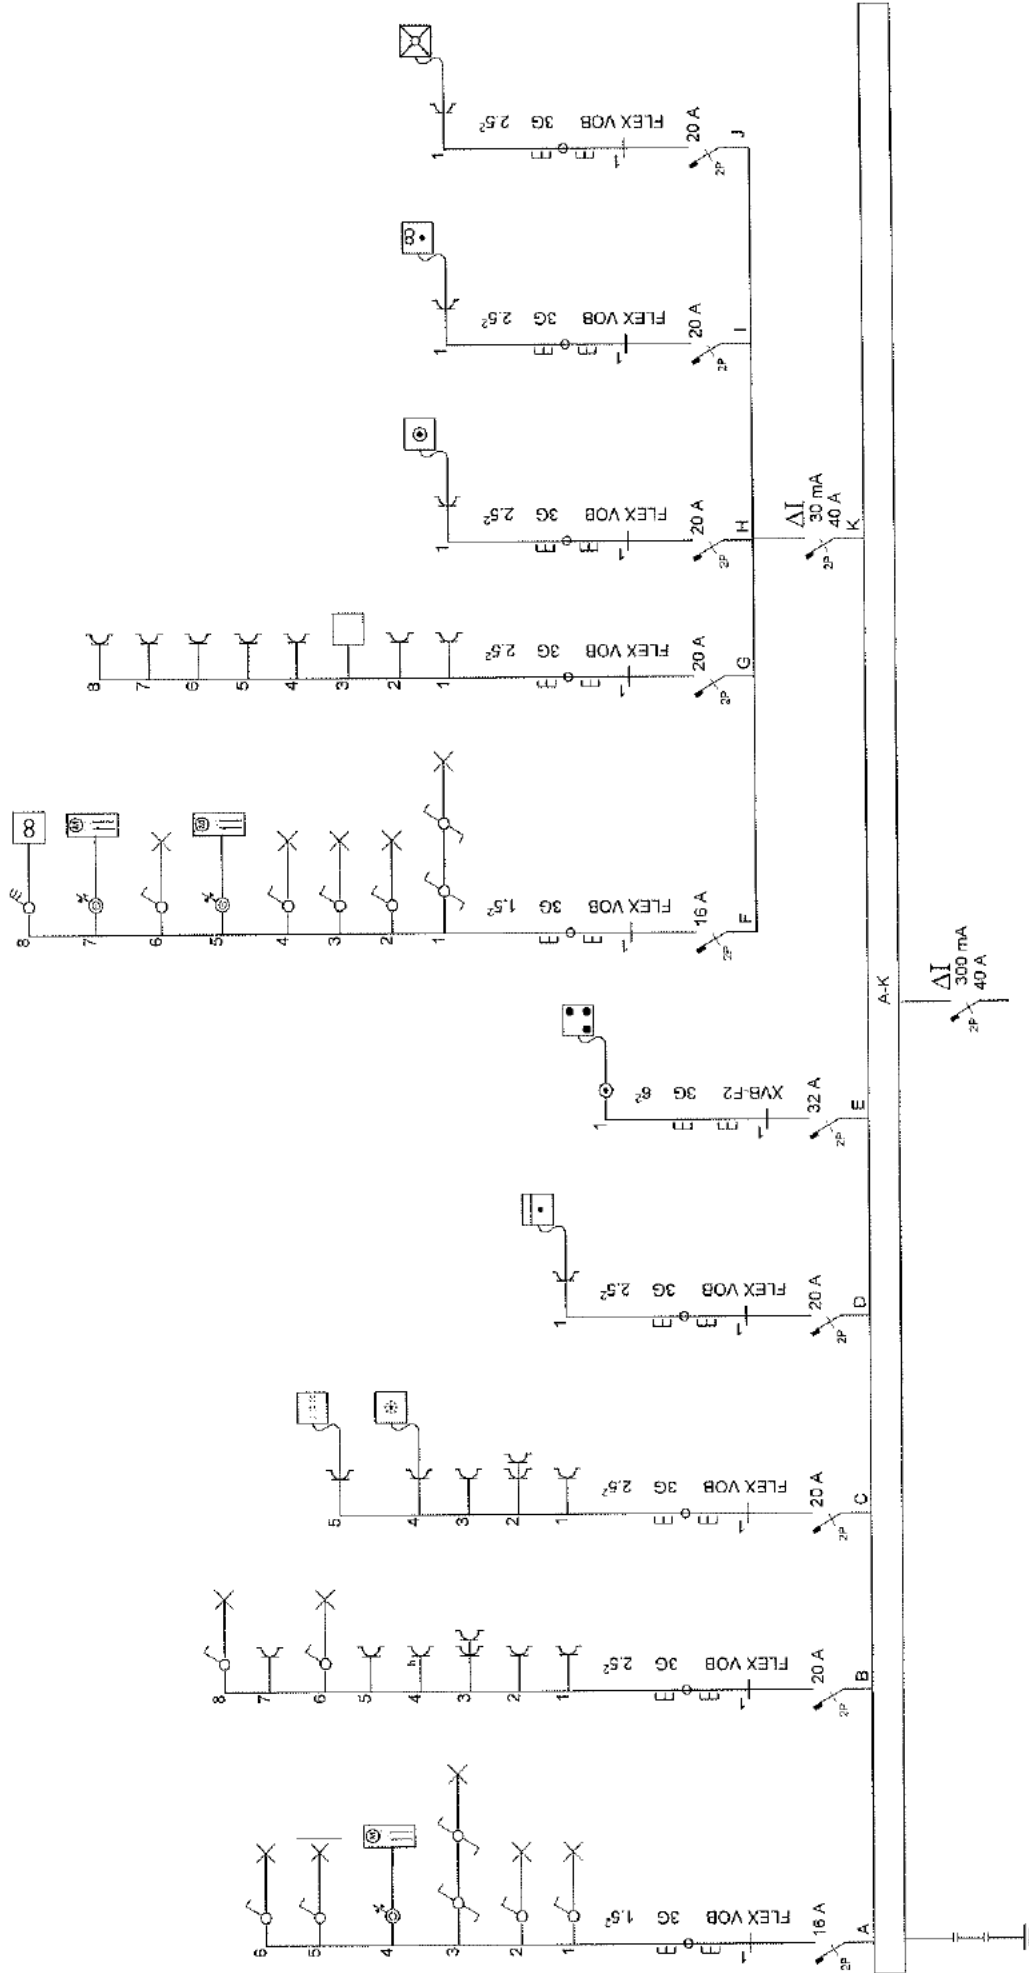

GEW. 10000

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom Elst Rudi BTW / TVA BE 435 621.159 Datum/Date 20-08-2009 Handtek/Sign	Organis. Vinçotte Naam/Nom - Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Straat/Rue Oude Baan 38 Gemeen/Comm 2160 Wommelgem Handtek/Sign	FIX-O-CAD 02541

Tableau d'egen

Inw W	1
Inw Port	1
Inw HWD	1
Stelia 63	36
Stelia 75	4

helder

