

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van de inspectie: D'URSELSTRAAT 26 Verdieping 2, 2660 ANTWERPEN

📄 Inspectietype: Voor Ingebruikname (6.4)

📅 Datum van het bezoek:
10/07/2026

📅 Volgend controlebezoek:
10/07/2051

👤 Agent-bezoeker:
Abdelaziz Achbari

BESLUIT: CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever	
Naam	PEB CERTI BV
Adres	BLAISANTVEST 105, 9000 GENT, Belgique
Eigenaar, Uitbater of Beheerder	
Naam	Eigenaar D'Urselstraat 26, 2660 Antwerpen, België
Adres	D'URSELSTRAAT 26 Verdieping 2, 2660 ANTWERPEN
Installateur	
Naam	
BTW	

Identificatie van de elektrische installatie

Adres	D'URSELSTRAAT 26 Verdieping 2, 2660 ANTWERPEN
Meternummer (Dag)	Nog te plaatsen
Meternummer (Nacht)	-
Distributienetbeheerder (DNB)	Fluvius
Gebouwtype	Appartement Verdieping 2
EAN-Code	54144

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Inspectietype	Voor Ingebruikname (6.4)
Datum van de uitvoering van de installatie	Na 01/06/2023
Funderingen	Vóór 81

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Verbinding Meter-Verdeelkast	XVB 2X10
Bedrijfsspanning	2 x 230 V
Algemene Beveiliging	40A 2P
Maximale Beveiliging	40A 2P
Aantal Verdeelborden	1
Aarding	Aardingspen
Spreidingsweerstand	19 Ω
Isolatie	>5Mohm M Ω

Differentieel(en)

Description	Type	Nominale Stroom	Gevoeligheid
40A-30mA	A	40 A	30 mA
40A-300mA	A	40 A	300 mA

Resultaten van de controle

Testapparatuur: FLK-TI-025 / 5816213

Schema's/Plannen	OK
Equipotentiale Verbindingen	OK
Testknop van de DAR (ΔI_n)	OK
Nominale Verschilstroom van de DAR (ΔI_n)	OK
Algemene Staatcontrole	OK
Aansluitingen	OK
Vast Materiaal	OK
Bescherming Tegen Directe Aanraking	OK
Bescherming Tegen Indirecte Aanraking	OK
Bescherming Tegen Overstroom	OK

Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's/Plannen	OK
------------------	----

Inbreuken

Nihil

Opmerkingen

Besluit van de controle

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Indien van toepassing, verklaart Atlas Contrôle dat de bezoekende agent de differentieelstroombeschermingsinrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, heeft verzegeld.

Het (de) eendraadsschema('s)- en situatieplan(en) werd door de bezoekende agent van Atlas Controle voor gezien getekend.

De volgende inspectie moet uiterlijk 25 jaar na de controle worden uitgevoerd.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Bezoekagent

Abdelaziz Achbari



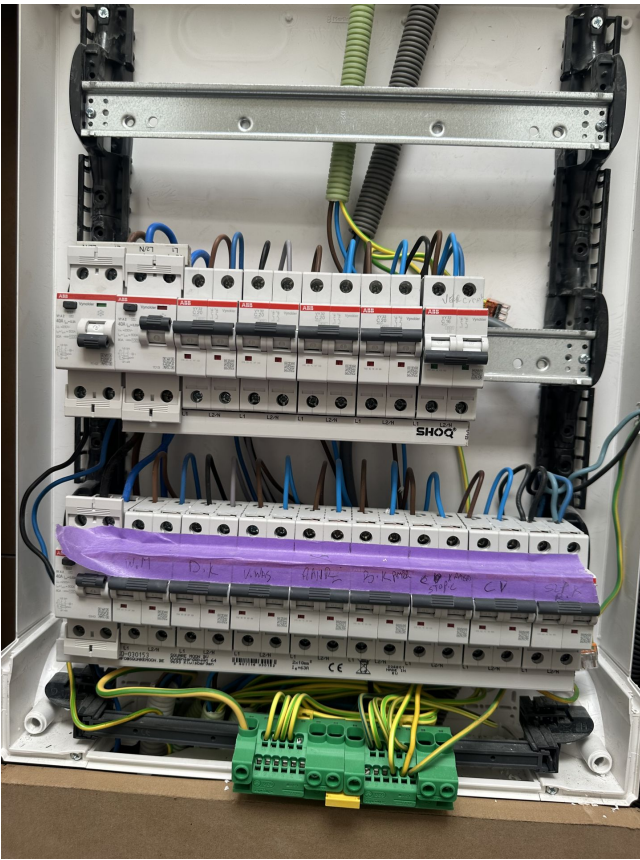
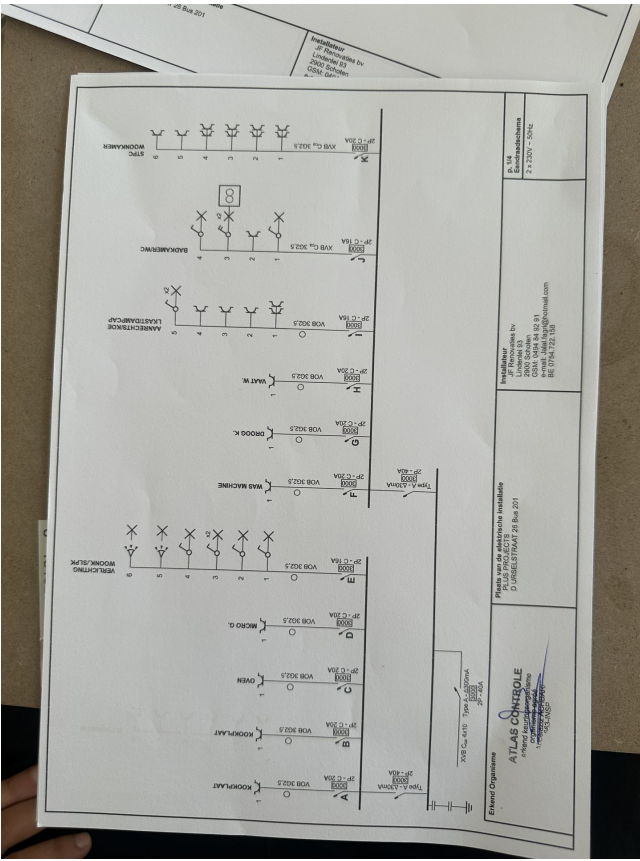
Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

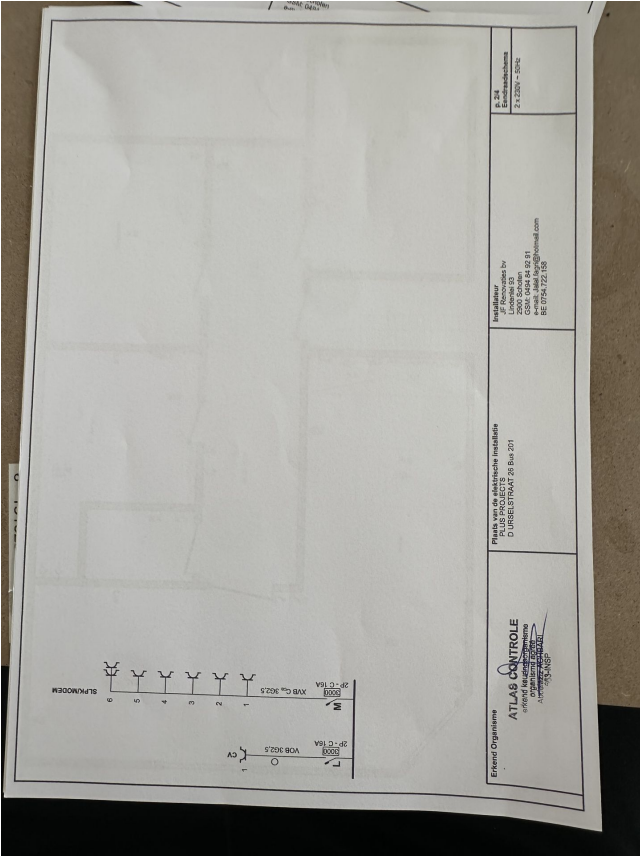
De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

Label	Foto
Bord	
Schema	

Label	Foto
Schema	
Schema	
